



# Desenvolvimento Ágil

Aula 03 · Bloco 1 — Software e processos

Quatro frases de 2001 — e o que se faz com elas na segunda-feira

# Nesta aula

---

1. O **Manifesto**, lido devagar
2. **Scrum** — os valores viram segunda-feira
3. **Kanban** e o limite de trabalho em andamento
4. **XP** — o que Scrum e Kanban não dizem
5. O **ágil teatral**: casca sem conteúdo

# O Manifesto, inteiro

---

**Indivíduos e interações** — mais que processos e ferramentas;

**Software em funcionamento** — mais que documentação abrangente;

**Colaboração com o cliente** — mais que negociação de contratos;

**Responder a mudanças** — mais que seguir um plano.

E a frase que quase ninguém cita: *"mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda."*

## Isso muda tudo

O Manifesto **não diz** que processo é ruim,  
que documentação é desperdício,  
nem que plano não serve.

Diz que, **quando os dois competirem**,  
o da esquerda decide.

*"Ágil quer dizer que não documentamos"* é a leitura  
errada


mais cara que existe — quatro comparações lidas  
como quatro **negações**.

# O que cada valor decide na prática

---

| O valor                 | O que ele <i>não</i> diz | O que ele decide                            |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Indivíduos e interações | "não use ferramenta"     | ferramenta que atrapalha a conversa, troque |
| Software funcionando    | "não documente"          | mostre rodando antes da página 40           |
| Colaboração             | "não faça contrato"      | contrato que impede resolver, renegocie     |
| Responder a mudanças    | "não planeje"            | plano é hipótese; quem muda é o plano       |

# Scrum: o ciclo

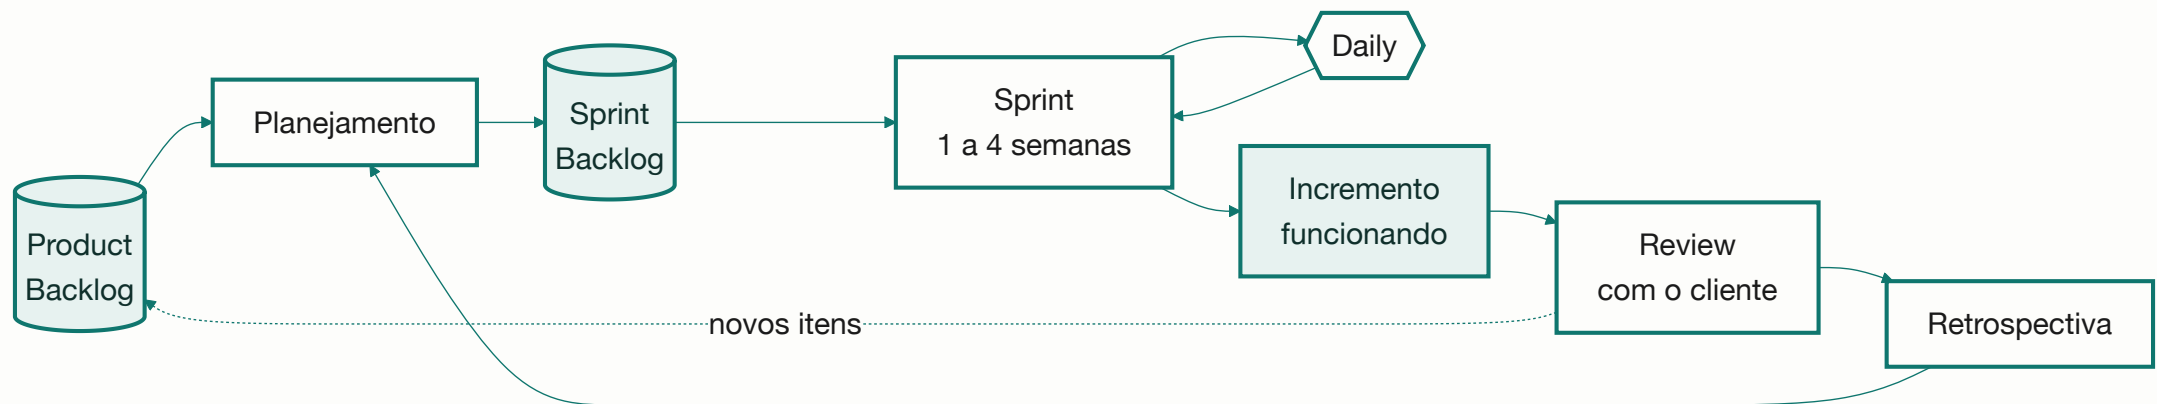

# Scrum: três responsabilidades

---

Papéis, **não** cargos:

- **Product Owner** — responde por o *quê* e em que ordem. Dono da lista e das prioridades;
- **Scrum Master** — remove impedimento e protege o processo. **Não** decide escopo, **não** manda em ninguém;
- **Desenvolvedores** — respondem por *como*, e por quanto cabe na Sprint.

**Cinco eventos:** a Sprint, o Planejamento, a Daily (15 min, entre o time), a Review (com o cliente) e a Retrospectiva (sobre o **processo**).

# O artefato mais subestimado

## A **Definição de Pronto**.

Sem ela, "terminei" significa coisas diferentes para cada pessoa — e a soma de cinco "terminados" não dá um incremento entregável.

Escrever a Definição de Pronto é escrever o critério de qualidade do time: decisão de **engenharia**, não de gestão.



# Kanban: começar é grátis, terminar é caro

---

Sexta-feira: catorze cartões em "Em andamento", nada em "Concluído" há três dias. Todo mundo ocupadíssimo, nada entregue.

1. **Visualize o fluxo** — as colunas do processo real, não do ideal;
2. **Limite o trabalho em andamento (WIP)** — um máximo por coluna;
3. **Gerencie o fluxo** — meça onde o cartão fica parado.

A regra que dói e funciona: **bateu o limite, você não começa outro cartão — ajuda a terminar um.**

## A Lei de Little

$$\text{tempo de ciclo} = \text{trabalho em andamento} \div \text{vazão}$$

Dobre o trabalho em andamento sem aumentar a capacidade do time e você **dobra o tempo** até cada item ficar pronto.

Nada foi entregue mais rápido;  
tudo ficou **mais tempo pela metade**.

# XP: nem Scrum nem Kanban falam de código

---

| Prática                     | O problema que ela resolve                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Integração contínua</b>  | integrar no fim = todos os conflitos de uma vez    |
| <b>Testes primeiro</b>      | teste escrito depois testa o que o código faz      |
| <b>Refatoração</b>          | projeto envelhece; melhorar é manutenção, não luxo |
| <b>Programação em par</b>   | revisão contínua em vez de revisão no fim          |
| <b>Propriedade coletiva</b> | "só o Pedro mexe nisso" é risco com nome bonito    |
| <b>Projeto simples</b>      | resolver o de hoje; o de amanhã pode não existir   |
| <b>Ritmo sustentável</b>    | time cansado produz defeito                        |



## Elas se sustentam umas às outras

Refatorar **sem teste automatizado** é apostar.

Integrar continuamente **sem teste**  
é integrar defeito mais rápido.

Adotar uma isolada costuma decepcionar —  
e a culpa vai injustamente para a prática.

# Ágil não é ausência de processo

Ágil tem, em geral, **mais** cerimônia visível que um projeto tradicional mal conduzido.

A diferença não é a quantidade de regras — é **de onde elas vêm e com que frequência mudam**:

|              | Processo pesado   | Ágil                          | Sem processo  |
|--------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| Quem define  | instância externa | o time, na retrospectiva      | ninguém       |
| Mudam quando | por comitê        | a cada ciclo, se atrapalharem | não existem   |
| Sabe-se pelo | cronograma        | software funcionando          | pela sensação |

# O ágil teatral

---

| O que se vê                                 | O que denuncia                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Sprint 1 "requisitos", Sprint 2 "modelagem" | cascata com nomes novos        |
| A Daily virou relatório para o gerente      | o evento mudou de dono         |
| Retrospectiva que nunca gera ação           | ritual sem consequência        |
| "Não temos tempo para teste nesta Sprint"   | Definição de Pronto decorativa |
| Backlog priorizado por quem grita mais alto | não há Product Owner de fato   |
| Nada documentado, e o Manifesto como defesa | leitura seletiva do texto      |

## O sintoma mais confiável

Pergunte quando foi a **última vez**  
que o time mudou o próprio processo  
por causa de uma retrospectiva.

Se a resposta for "*nunca*",  
aquilo não é um processo adaptativo —  
é um processo pesado com **vocabulário novo**.

# Exercícios da aula

---

Na pasta `aula-03/` :

1. `ex01.md` — traduza os quatro valores em decisões concretas do projeto;
2. `ex02.md` — monte uma Sprint de duas semanas, com Definição de Pronto;
3. `ex03.md` — diagnostique o gargalo de um quadro Kanban travado;
4. `ex04.md` — que valor foi violado em cada uma de cinco situações;
5. **Desafio**  `ex05.md` — **audite um time que se diz ágil**: 10 perguntas e um parecer.



## **Próxima aula**

### **Aula 04 — Como o software chega ao usuário**

Do commit à produção: esteira, ambientes,  
DevOps e as quatro métricas DORA.
