



Os Processos de um Projeto


Aula 03 · Bloco 1 — Fundamentos de Projetos

Replanejar não é fracasso do plano. É o uso previsto dele.

Nesta aula

1. Os **cinco grupos** de processo
2. **Iniciação** — o termo de abertura
3. **Planejamento** — escopo, EAP e cronograma
4. **Execução e controle** — a linha de base
5. **Encerramento** — aceite, arquivo, lições aprendidas

Os cinco grupos de processo

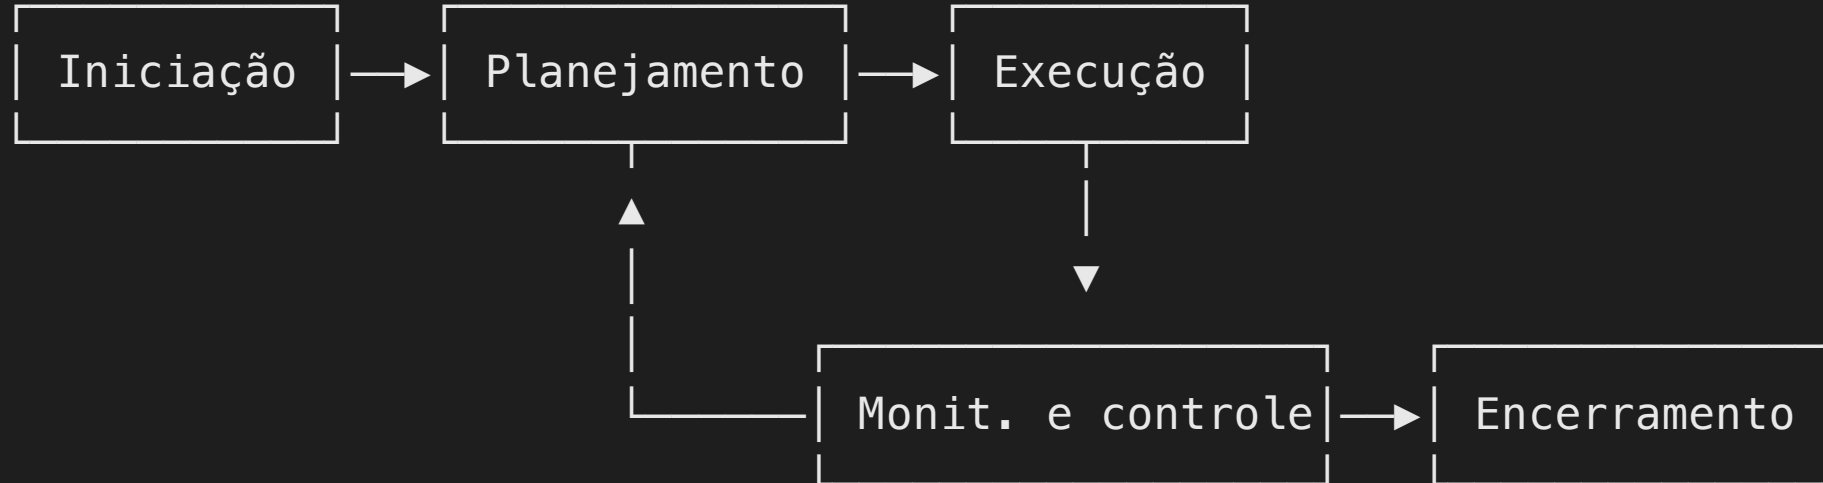

Não são fases — acontecem em paralelo e se repetem a cada ciclo.

O laço de volta é o que importa

Replanejar não é fracasso do plano:

é **o uso previsto dele**.

Adaptativo passa por ali
a cada duas semanas.

Preditivo, a cada marco.

Iniciação: o termo de abertura

Problema	controle em planilha; penalidade não aplicada
Resultado esperado	empréstimo, devolução e reserva registrados
Fora do escopo	compra de equipamento, integração com patrimônio
Prazo	em uso no início do período letivo — data de calendário
Premissas	verba aprovada; equipe de 4 em tempo parcial
Restrições	verba expira no fim do exercício


Duas linhas que salvam projeto

Fora do escopo. Escrever o que **não** será feito é mais útil que escrever o que será — é ali que nasce o pedido de outubro.

Premissas. Algo que se assume verdadeiro **sem ter certeza**. Se cai, o plano cai junto.

💡 "Equipe de 4 em tempo parcial" é exatamente o tipo de coisa que muda em agosto sem ninguém avisar o projeto.

Planejamento: a EAP

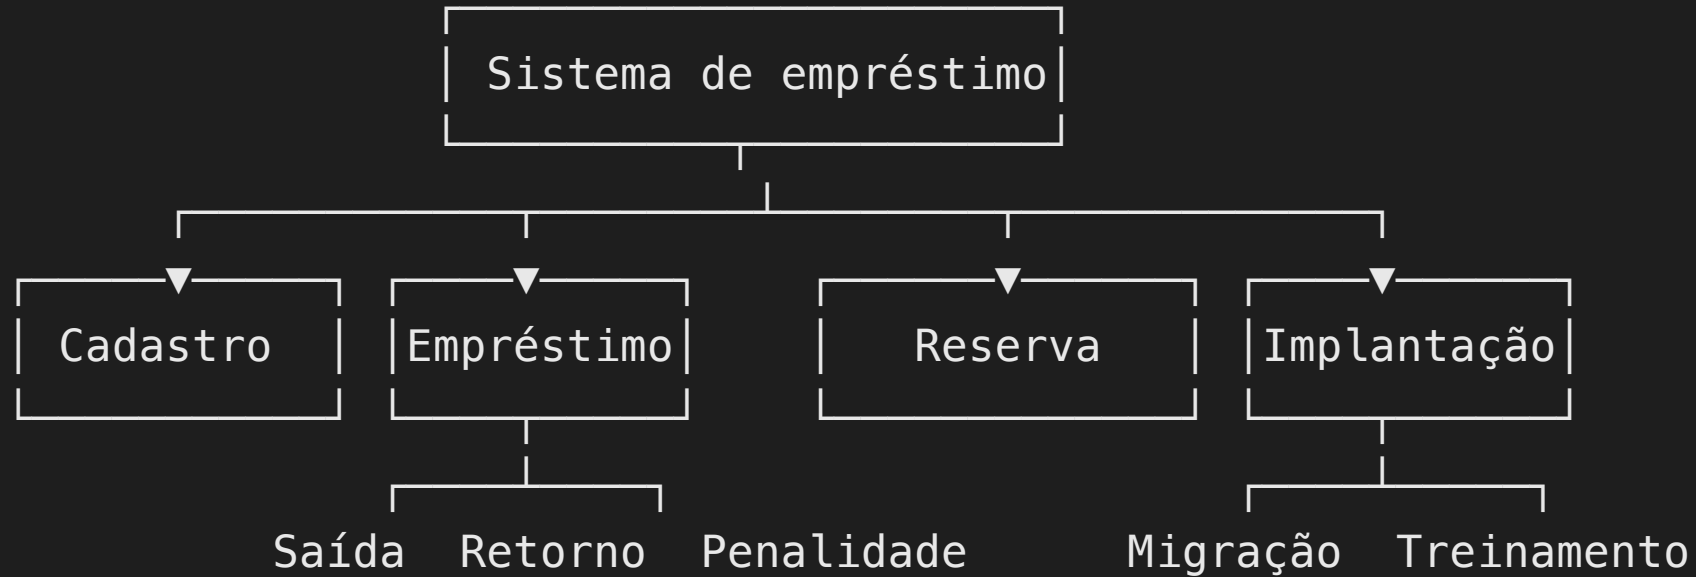

A soma das partes é o todo. O que não está na EAP não está no projeto.

EAP que virou ciclo de vida

Se o segundo nível for
levantamento, desenho, construção, testes,
você desenhou o **processo**,
não o produto —
e perdeu a única pergunta
que a EAP responde bem.

O cronograma vem da EAP

Folha da EAP	Duração	Depende de	Responsável
Cadastro de itens	3 sem	—	dupla A
Registro de saída	2 sem	cadastro	dupla A
Registro de retorno	2 sem	registro de saída	dupla B
Penalidade por atraso	1 sem	registro de retorno	dupla B
Treinamento do balcão	1 sem	tudo acima	gerente

A coluna **depende de** é o que transforma lista em cronograma.

Controle: a linha de base

Entrega	Linha de base	Real	Desvio
Cadastro de itens	15/03	14/03	–1 dia
Empréstimo e devolução	30/04	12/05	+12 dias
Reserva	31/05	—	em andamento
Implantação	30/06	—	previsto 12/07

Metade da tabela olha para trás; **a outra metade para a frente** — e é ela que permite decidir.

O desvio dispara decisão, não relatório

Decisão	O que custa	Quando faz sentido
Recuperar o prazo	horas extras, qualidade	a causa já passou
Cortar escopo	funcionalidade esperada	há escopo cortável
Mover a data	credibilidade, contrato	a data não é imóvel

Nenhuma delas é "**seguir tentando**" — que é o que acontece quando ninguém decide.

Encerramento: três partes

Aceite formal — alguém com autoridade declara que atende. Sem isso o projeto não termina: apenas para.

Arquivo — o que se produziu fica onde a próxima pessoa encontra.

Lições aprendidas — é o único dos três que serve a **outro** projeto.

O custo de não encerrar

não aparece neste projeto.

Aparece no próximo —
e por isso ninguém o atribui
à decisão que o causou.

Lição aprendida não é lista de culpados

O registro útil descreve **situação** e **decisão**:

"A integração com o legado foi deixada para o último mês, e o único conhecedor do sistema saiu de férias."

Um registro que acusa pessoas garante que o próximo projeto não escreva nenhum.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-03/` :

1. `ex01.md` — oito atividades nos cinco grupos de processo;
2. `ex02.md` — termo de abertura da rede de doação, com premissas;
3. `ex03.md` — EAP em Mermaid, com um entregável que não é software;
4. `ex04.md` — as três decisões possíveis diante de +12 dias;
5. `ex05.md` 🌶️ — encerrar com um aceite recusado, e sem culpar ninguém.

Próxima aula

Aula 04 — Arquitetura como decisão de projeto

A decisão mais cara de reverter
não é técnica por acaso:
ela consome orçamento
e exige disponibilidade da operação.
