



Ferramentas e Comunicação

Aula 12 · Bloco 3 — Ferramentas e Qualidade

A ferramenta não decide nada. Ela mostra.

Nesta aula

1. A ferramenta **não é o método**
2. Ferramentas para modelos **sequenciais**
3. Ferramentas para modelos **ágeis**
4. **Kanban** e o limite de trabalho em andamento
5. **Gestão da comunicação**
6. O plano de comunicação **numa tabela**

A ferramenta funcionava perfeitamente

A transportadora comprou uma ferramenta ágil, migrou os projetos para quadros e chamou as fases de sprints.

Escopo, prazo e orçamento continuaram **fechados no início do ano**.

Seis meses depois, a equipe está frustrada: prometeram adaptação e ela nunca aconteceu.

Trocar a ferramenta é barato

Mudar o contrato,
a expectativa da diretoria
e a disponibilidade do cliente
não é.

É por isso que a adoção
quase sempre para
na parte visível.


O que se ganha de verdade

Visibilidade. Ela não decide nada, não prioriza nada e não conserta processo. Mostra.

E mostrar já é bastante: o quadro que expõe catorze itens parados não resolve nada — e torna impossível continuar dizendo que está tudo andando.

💡 A pergunta antes de escolher: **o projeto é preditivo ou adaptativo?**

Sequenciais: EAP, Gantt, marco

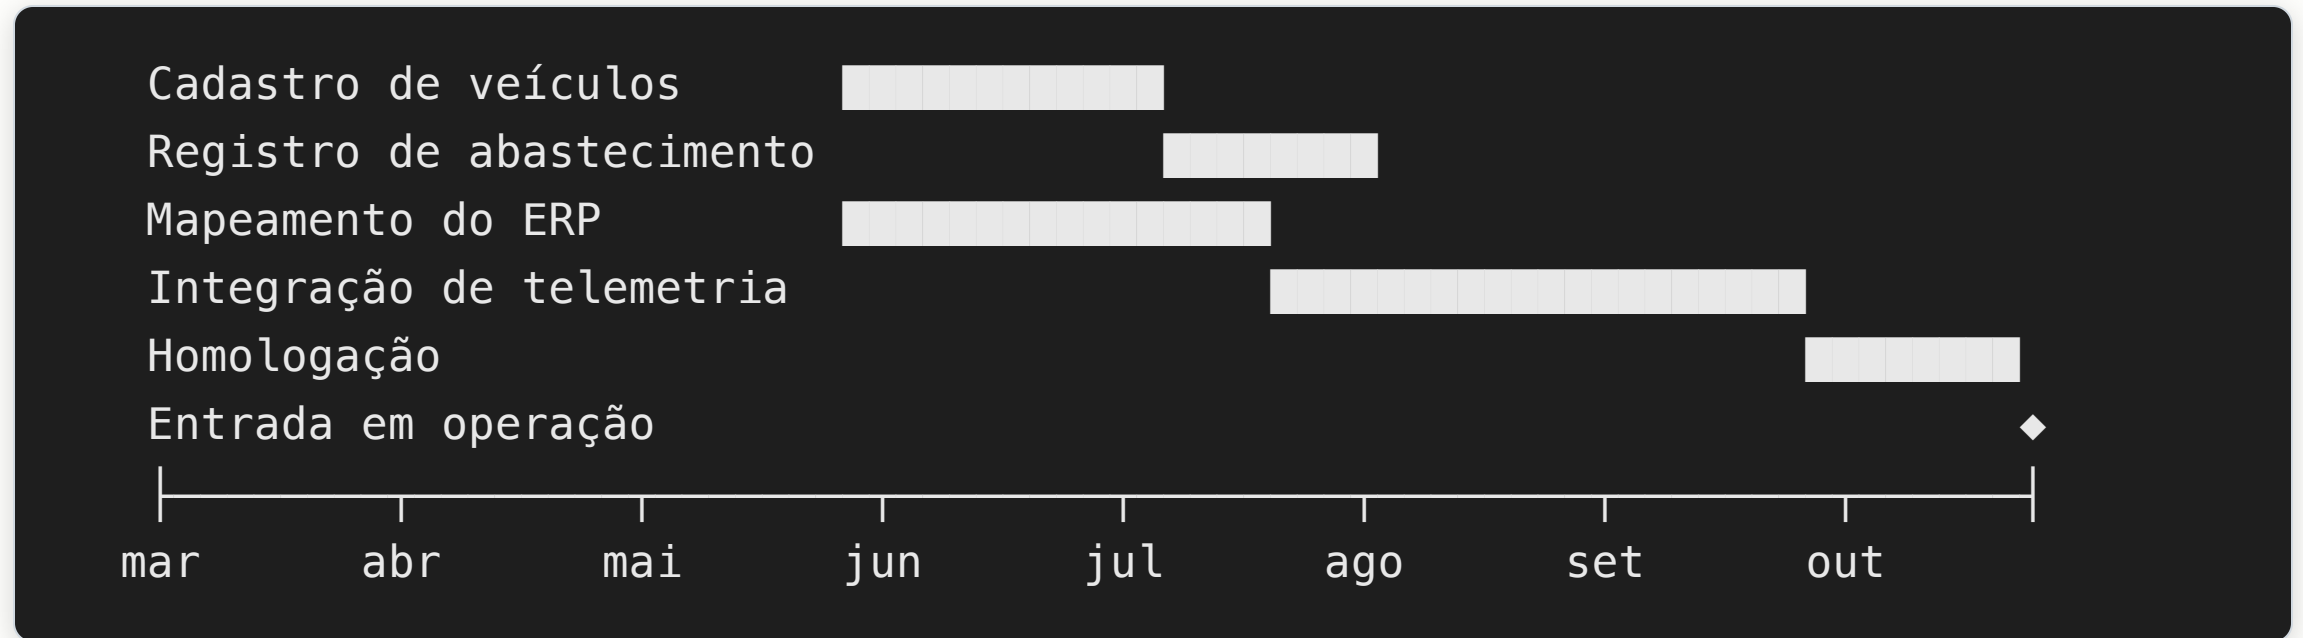

Caminho crítico: mapeamento + telemetria = 63 dias, contra 35 do cadastro.

Como se lê um Gantt

Nesta ordem: **o marco** no fim, **a cadeia mais longa** até ele, e **onde há folga**.

Atrasar o cadastro em uma semana **não move a entrega**. Atrasar o mapeamento move — ele está no caminho crítico.

⚠ O Gantt é a foto de uma decisão, e envelhece. Se as barras não mudam há dois meses, ou o projeto é perfeito ou ninguém está replanejando.

Ágeis: backlog, quadro, burndown

Instrumento	Pergunta que responde
Backlog ordenado	o que fazemos a seguir?
Quadro	onde o trabalho está travando?
Burndown	vamos chegar?

Os três são de **fluxo** — e nenhum diz se o que está sendo feito **importa**.

O quadro, com limites

A FAZER	FAZENDO limite: 2	REVISÃO limite: 1	PRONTO
Relatório Filtro	Reg. retorno Mapea. ERP	Reg. saída	Cadastro

O burndown se lê pela inclinação

Dia	Ideal	Real	O que já diz
3	32	38	a inclinação real é menor: atenção
5	24	30	dá para prever que metade não sai
7	16	34	subiu — entrou escopo no meio
10	0	22	fechou com pouco mais da metade

A leitura útil acontece no dia 5, não no dia 10.

Por que o limite funciona

- **Começar é grátis, terminar é caro.** Sem limite, todos começam;
- **Item parado não entrega valor.** Cinco itens 80% prontos valem zero;
- **O limite força a conversa certa.** De *"quem está livre?"* para *"o que precisa terminar?"*.

A regra prática: **limite menor que o número de pessoas.**

O limite mais revelador

não é o de "Fazendo".

É o das colunas de **espera** —
revisão, homologação —,
que costumam não ter limite
porque parece que
"só estão aguardando".

O plano de comunicação

Interessado	Precisa saber	Frequência	Formato
Diretoria	se data e custo se sustentam	mensal	1 página, com semáforo
Gestor de frota	o que muda na operação	quinzenal	reunião 30 min + resumo
Equipe	tudo que afeta a semana	diária	conversa e quadro
Oficina	quando o sistema sugere janelas	por marco	comunicado curto
Auditoria	o que foi decidido e quem aprovou	sob demanda	registro no repositório

Três regras que a tornam usável

Uma linha por interessado, não por reunião — senão quem não tem reunião some do plano.

Quem envia é uma pessoa. "A equipe informa" não informa nada.

Notícia ruim vai antes do canal previsto, e diretamente. O plano estabelece o mínimo, não o teto.

O que fecha o Bloco 3

Risco, qualidade, documentação
e comunicação são a mesma coisa:

**fazer a informação chegar
a tempo a quem decide.**

Nenhuma produz software.

Todas evitam que ele
seja feito errado.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-12/` :

1. `ex01.md` — cinco situações: Gantt, quadro ou burndown?
2. `ex02.md` — caminho crítico, folga, e o efeito de duas semanas de atraso;
3. `ex03.md` — 14 cartões em "Fazendo": diagnóstico e limites;
4. `ex04.md` — plano de comunicação do prontuário, com o comitê de ética;
5. `ex05.md` 🌶️ — a ferramenta ágil comprada para projetos preditivos.

Próxima aula

Aula 13 — Versão, mudança e configuração

O Bloco 4 começa
onde a mudança encontra
o sistema que já está no ar.
