



# Quem Responde pelo Quê

Aula 07 · Bloco 2 — Metodologias de Gestão

Quando escopo, data e custo travam, a qualidade cede em silêncio

# Nesta aula

---

1. Duas perguntas, **duas naturezas**
2. O **gerente de projeto**: o que ele decide
3. O **Product Owner**: o que ele decide
4. Quando os dois **colidem**
5. **Stakeholder**: o que se cobra dele
6. A matriz **poder x interesse**

# Duas decisões na mesma segunda-feira

---

**"O fluxo de disputa entra antes ou depois do pagamento retido?"**

→ pergunta de **valor**

**"A reserva acaba em quatro meses — o que se faz com isso?"**

→ pergunta de **entrega**

Num projeto pequeno as duas caem na mesma pessoa. O problema é ninguém ter dito **qual está sendo respondida**.

# A frase mais curta que separa os três

O **PO** decide o quê e o porquê.

O **time** decide o como.

O **gerente** responde  
pelo quando e por quanto.

# O gerente de projeto

---

| Decide                       | Não decide                         |
|------------------------------|------------------------------------|
| replanejar quando há desvio  | o que é mais valioso               |
| escalar um risco à diretoria | qual funcionalidade entra primeiro |
| pedir aditivo ou mais gente  | como o time organiza o trabalho    |
| o que se comunica, a quem    | a solução técnica                  |

O trabalho dele é **antecipar**: ver em maio o atraso que apareceria em julho.

# A assimetria da carreira

O gerente é cobrado  
**pelo que apareceu,**  
não pelo que não aconteceu.

Quem decidiu em maio e evitou  
dois meses de atraso não tem como provar:  
o projeto entregou no prazo,  
e parece que foi fácil.

# O Product Owner exige três coisas

---

| Falta                   | Sintoma no time                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| disponibilidade         | dúvidas se acumulam; o time decide sozinho e erra |
| autoridade              | toda decisão sobe uma instância                   |
| conhecimento do negócio | o backlog é ordenado por quem grita mais alto     |

**PO por procuração não é PO.** Se ele valida cada ordenação com um comitê, o PO de fato é o comitê — que não está disponível toda semana.

# Quando os dois colidem

---


Falta um mês. O backlog tem quinze itens. O gerente quer cortar sete; o PO diz que quatro deles dão sentido ao produto.

**Os dois estão certos dentro do próprio papel.**

| Se ceder...        | Quem decide                     |
|--------------------|---------------------------------|
| o <b>escopo</b>    | Product Owner                   |
| a <b>data</b>      | patrocinador, ou o contrato     |
| o <b>custo</b>     | patrocinador                    |
| a <b>qualidade</b> | <b>ninguém</b> — não é variável |



# As quatro variáveis

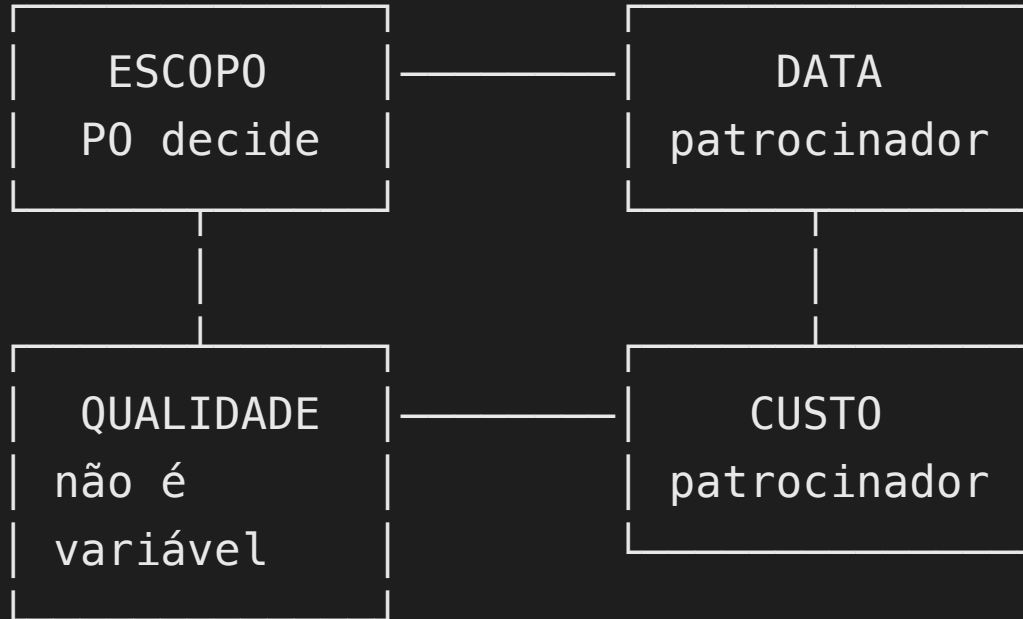

**Três travadas, a quarta cede.** E a quarta cede em silêncio.

## **Qualidade não é folga**

Quando escopo, data e custo  
estão todos travados,  
a única folga que sobra  
é a qualidade —  
e ela cede **sem que ninguém  
tenha decidido nada.**

# Stakeholder: o que se cobra dele

---

| Do stakeholder                                  | Exemplo                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| estar disponível quando só ele tem a informação | o supervisor que valida o formato do relatório  |
| decidir dentro do prazo combinado               | o comitê de ética, que se reúne uma vez por mês |
| assumir a consequência do que pediu             | quem exigiu o relatório extra                   |
| comunicar mudança no próprio contexto           | a secretaria que troca de sistema e não avisa   |

# O stakeholder que não vai aparecer

---

Três saídas, e a escolha é do projeto:

- **Substituir a fonte** — alguém de dentro que conheça o assunto;
- **Reduzir o que se pede** — um clique num link, em vez de acesso ao sistema;
- **Assumir e registrar** — decidir sem ele, com a premissa escrita.

**Continuar marcando reuniões que ele não atende não é uma delas.**

# Matriz poder x interesse — Ouvidoria

| Interessado                    | Poder | Interesse     | Estratégia                   |
|--------------------------------|-------|---------------|------------------------------|
| Secretário de Governo          | alto  | alto          | gerenciar de perto           |
| Ouvidor-geral                  | médio | alto          | manter informado e consultar |
| Secretário do órgão que atrasa | alto  | <b>contra</b> | gerenciar de perto           |
| Cidadão                        | baixo | alto          | manter informado             |
| Controladoria                  | alto  | baixo         | manter satisfeito            |

# Interesse não é estar a favor

O secretário do órgão que atrasa  
tem interesse **alto** e joga contra.

Ele precisa da mesma atenção  
que o patrocinador —  
por motivo oposto.

Opositor surpreendido é muito  
mais caro que opositor consultado.

# Exercícios da aula

---

Na pasta `aula-07/` :

1. `ex01.md` — oito decisões entre GP, PO e time;
2. `ex02.md` — três situações em que acumular GP e PO decide errado;
3. `ex03.md` — o que se cobra de cada interessado do controle de estágio;
4. `ex04.md` — matriz poder × interesse do prontuário;
5. `ex05.md` 🌶️ — quinze itens, um mês, e a variável que vai ceder.

## **Próxima aula**

### **Aula 08 — Descobrir, enxugar, melhorar**

Design Thinking, MVP e Lean  
não são sinônimos de "trabalhar melhor".

Cada um responde  
a uma pergunta diferente.
