



Quem Responde pelo Quê


Aula 07 · Bloco 2 — Metodologias de Gestão

Quando escopo, data e custo travam, a qualidade cede em silêncio

Nesta aula

1. Duas perguntas, **duas naturezas**
2. O **gerente de projeto**: o que ele decide
3. O **Product Owner**: o que ele decide
4. Quando os dois **colidem** — e a variável que ninguém autoriza
5. **Stakeholder**: o que se cobra dele
6. A matriz **poder x interesse**

Duas decisões na mesma segunda-feira

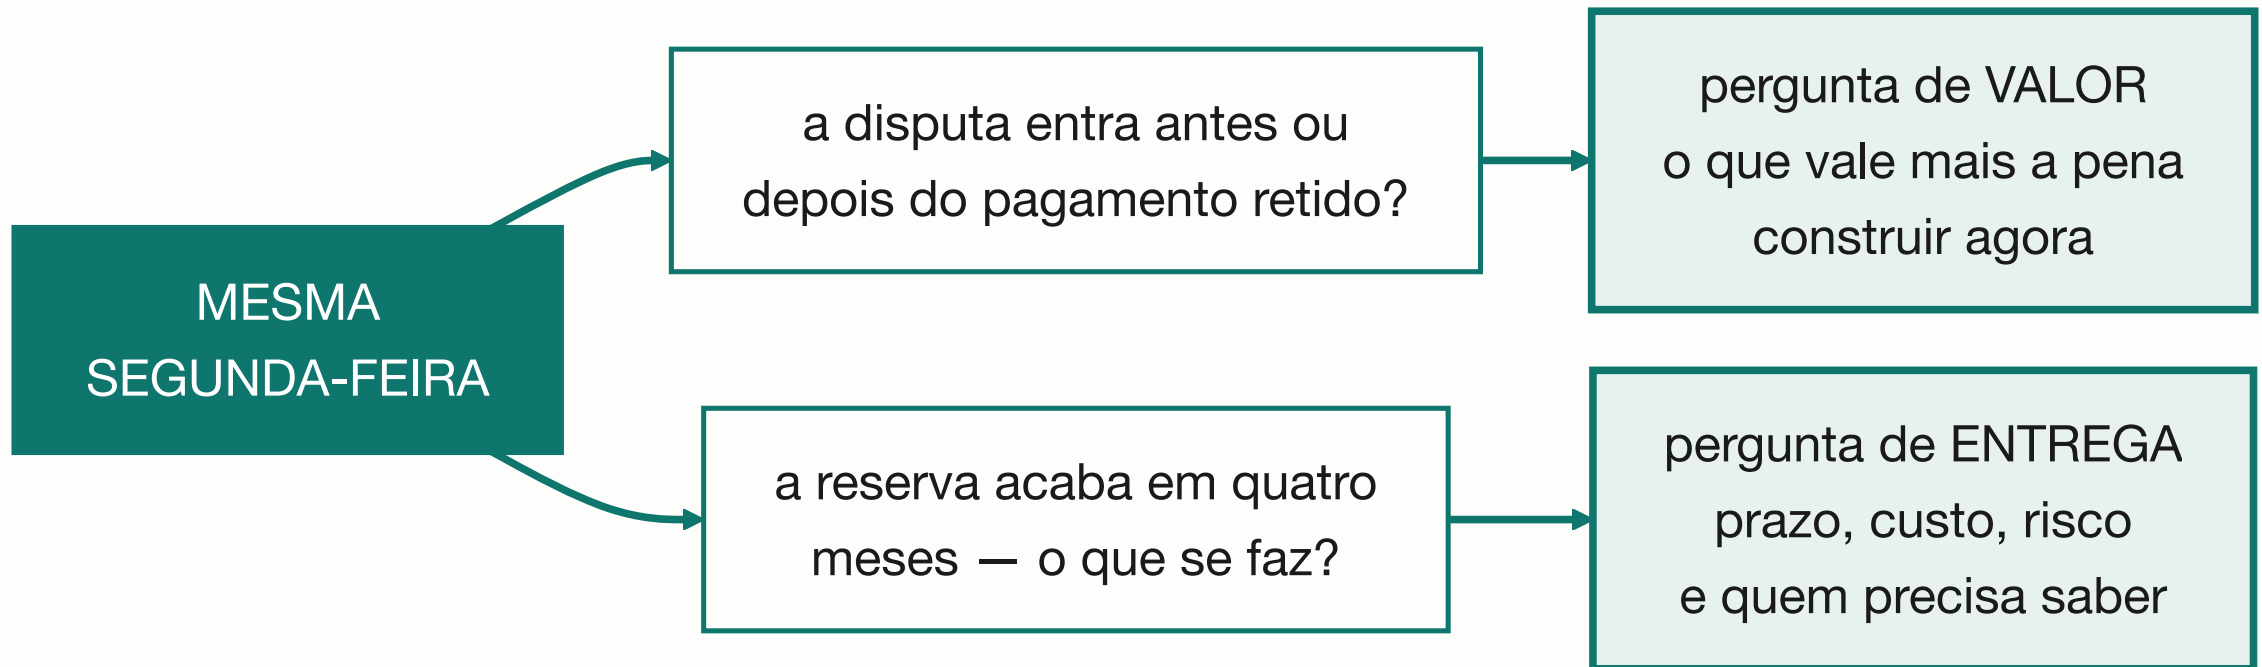

Uma é de **valor**, a outra de **entrega**. O problema não é a mesma pessoa responder às duas — é ninguém dizer **qual está sendo respondida**: prazo tem data, valor não tem.

Quem responde pelo quê

PRODUCT OWNER
— — —
decide
O QUÊ e O PORQUÊ

TIME
— — —
decide
O COMO

GERENTE DE PROJETO
— — —
responde pelo
QUANDO e POR QUANTO

É a frase mais curta que separa os três, e ela **resolve a maioria das discussões de fronteira**. O gerente é o papel que o guia do Scrum não descreve — e que continua existindo.

O gerente de projeto


Responde por **entregar o combinado**: prazo, custo, risco e comunicação.

Decide	Não decide
replanejar quando há desvio	o que é mais valioso para o produto
escalar um risco à diretoria	qual funcionalidade entra primeiro
pedir aditivo, prorrogação ou mais gente	como o time organiza o trabalho
o que se comunica, a quem e quando	a solução técnica

O trabalho dele é **antecipar** — e ele é cobrado pelo que apareceu, não pelo que evitou.

O Product Owner

Decide **o que se faz e em que ordem** — e o papel só funciona com as três:

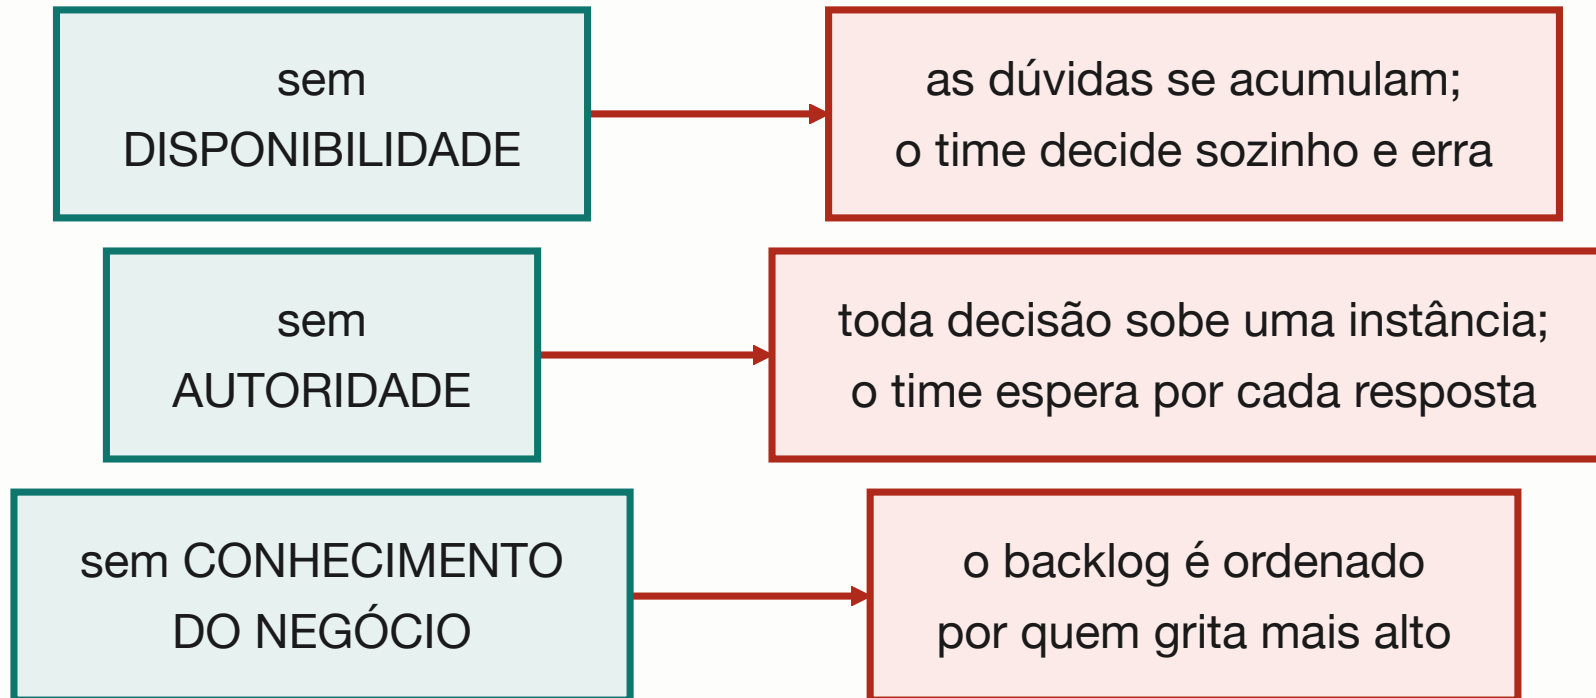

O caso mais comum: PO sem autoridade


Uma pessoa disponível e bem-intencionada que **leva toda decisão para uma instância superior**. O time percebe rápido e para de perguntar — e passa a decidir por conta própria coisas que não deveria.

 **PO por procuração não é PO.** Se quem ordena o backlog valida cada ordenação com um comitê, o Product Owner de fato é o comitê — e o comitê não está disponível toda semana.

Nesse caso, é mais honesto reconhecer, como na Aula 05, que o projeto **não tem as condições do ágil** do que manter a ficção.

Quando os dois colidem


Falta um mês e há quinze itens: o gerente quer cortar sete, o PO diz que quatro dão sentido ao produto. **Os dois estão certos** — decide quem manda na variável que cede:

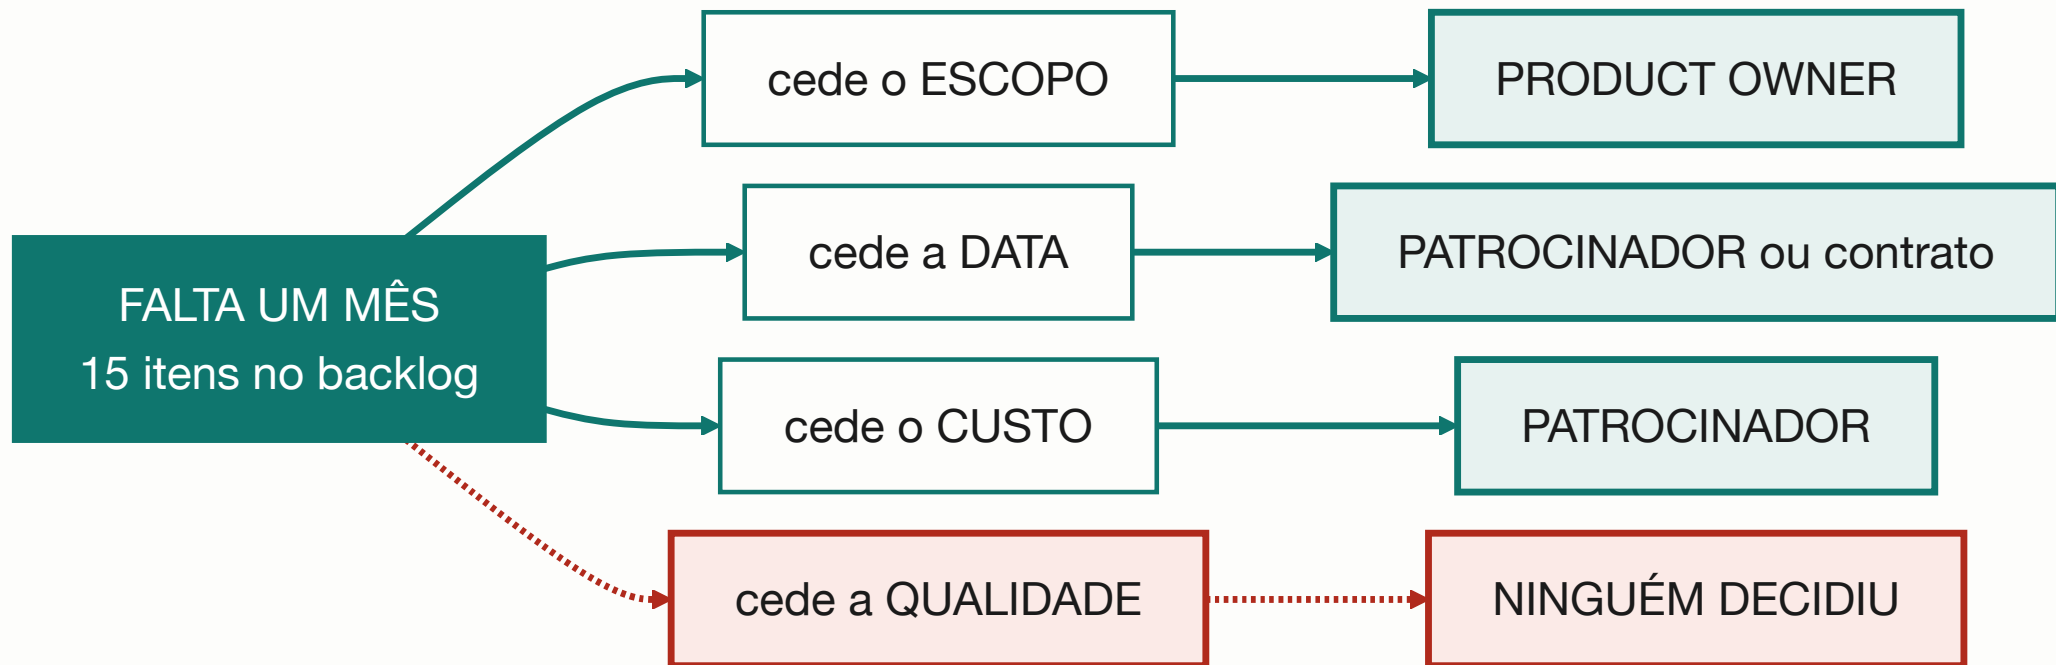

Qualidade não é folga

Quando escopo, data e custo
estão todos travados,
a única folga que sobra
é a qualidade —
e ela cede **sem que ninguém
tenha decidido nada.**

Com registro, ou por omissão

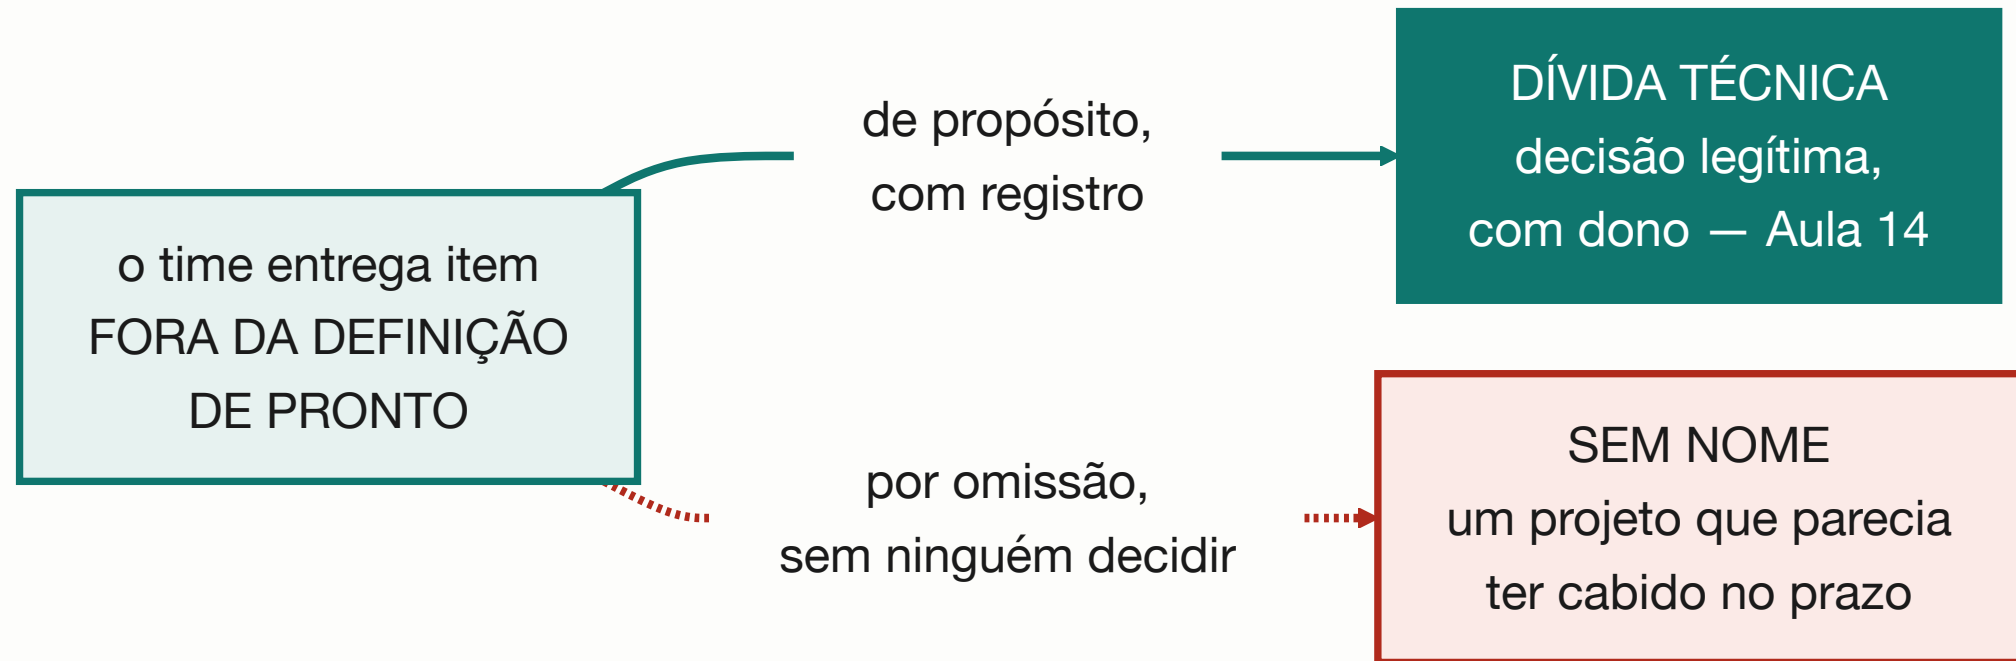

Qualidade é **o que a Definição de Pronto protege**. Item que não passa na lista é o projeto usando a única folga que ninguém autorizou.

Parte interessada: quem é, e o que se cobra

Parte interessada é quem afeta o projeto ou é afetado por ele. A lista precisa ser **feita, não intuída**.

Costuma faltar quem **audita**, quem **opera depois**, quem **perde** algo e quem **impõe requisito** sem usar o sistema — nenhum deles pede para entrar.

E stakeholder tem **responsabilidade**, não só direito: estar disponível quando só ele tem a informação, decidir no prazo combinado, assumir o que pediu e avisar quando o próprio contexto muda.

Quando ele não vai aparecer



O stakeholder ausente é **risco, não detalhe** — e quem escolhe a saída é o projeto.

A matriz poder x interesse — Ouvidoria



Listar é fácil; o trabalho é **decidir quanto de atenção cada um recebe**.

Interesse não é estar a favor

O secretário do órgão que atrasa
tem interesse **alto** e joga contra.

Ele precisa da mesma atenção
que o patrocinador — por motivo oposto.

Opositor surpreendido é muito
mais caro que opositor consultado.

Próxima aula

Aula 08 — Descobrir, enxugar, melhorar

Design Thinking, MVP e Lean
não são sinônimos de "trabalhar melhor".

Cada um responde
a uma pergunta diferente.
